AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

aca S.p.a.

Via Maestri del lavoro d'Italia, n. 81 - 65125 Pescara - tel 085 4178200
fax 085 4156113 - Sito web: www.aca.pescara.it - P.IVA 01318460688

DISMISSIONE DI FOSSE IMHOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

PROGETTO ESECUTIVO — **OTTOBRE 2022**

CP-00-002 GENERALE - SICUREZZA

CRONOPROGRAMMA

CODICE: 046-017-18-E-00-GE-CP-00-002-14-00-241022

Revisione	Data	Riferimento revisione	Eseguito	Controllato	Approvato
0	10 / 2022	EMISSIONE	GCB	ACB	IRB

SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Viale B. Croce, 147 - 66100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871/563055 - Fax 0871/572588
e-mail: amministrazione@sisel.info / PEC: acquisizioniservizi@pec.sisel.it

DIRETTORI TECNICI:
Arch. Carmine BRANDI — Ing. Roberto BRANDI

PROGETTISTI:
Arch. Carmine BRANDI — Ing. Roberto BRANDI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CHIETI — ARCHITETTO CARMINE BRANDI — ISCRITTO ALL'ALBO N. 403

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI — INGEGNERE ROBERTO BRANDI — N. 641

APPROVAZIONI

CONSULENTI:

Responsabile unico del Procedimento

Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente né in parte senza l'autorizzazione scritta da parte della società
Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.
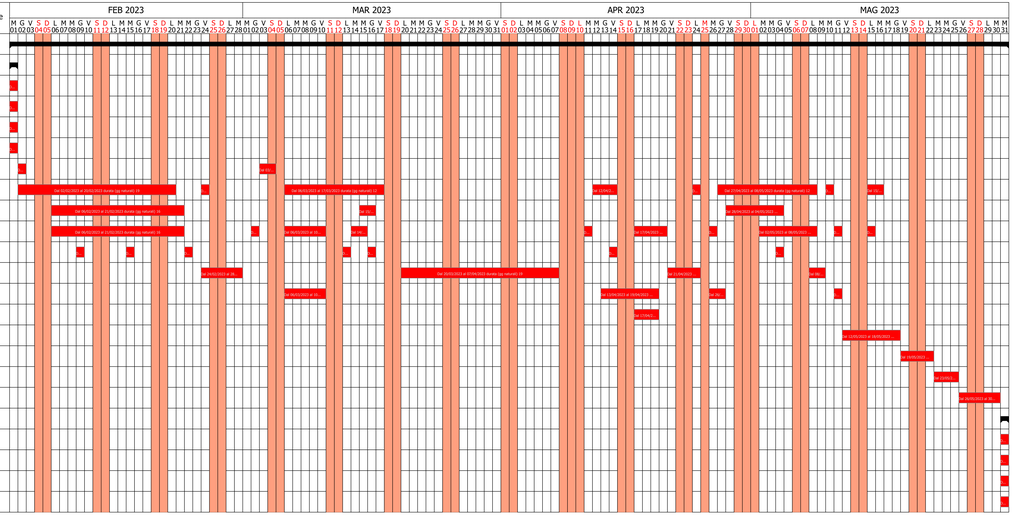
Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	Area	N. squadre	Comp. squadre	Tot. lav.	Prod. g. sq	Impresa esecutrice
Diagramma di Gantt	83/120	01/02/2023	31/05/2023						
Allestimento cantiere	1/1	01/02/2023	01/02/2023						
Delimitazione lavori stradali	1/1	01/02/2023	01/02/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Baracche di cantiere	1/1	01/02/2023	01/02/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Servizi igienici di cantiere	1/1	01/02/2023	01/02/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Impianto elettrico di cantiere	1/1	01/02/2023	01/02/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Taglio manto stradale	3/3	02/02/2023	04/03/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Scavi di trincee e stesura del letto di posa	38/51	02/02/2023	16/05/2023	Intero cantiere	1	3	3	45	
Posa di condutture in materiale plastico pesante	18/25	06/02/2023	04/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Rinfianco e rinterro tubazioni	33/39	06/02/2023	15/05/2023	Intero cantiere	1	3	3	400	
Posa dei telai e dei chiusini	7/7	09/02/2023	04/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Vasca di accumulo	22/30	24/02/2023	09/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate	13/15	06/03/2023	11/05/2023	Intero cantiere	1	4	4	50	
Staffaggio tubo bordo ponte	3/3	17/04/2023	19/04/2023	Intero cantiere	0	0	0	0	
Impianto di pompaggio	5/7	12/05/2023	18/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Controllo di tenuta della condotta	2/4	19/05/2023	22/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Binder di collegamento con bitume liquido	3/3	23/05/2023	25/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Formazione di strati di collegamento e di usura	3/5	26/05/2023	30/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Smobilizzo cantiere	1/1	31/05/2023	31/05/2023						
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico	1/1	31/05/2023	31/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Delimitazione lavori stradali	1/1	31/05/2023	31/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Servizi igienici di cantiere	1/1	31/05/2023	31/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0	
Impianto elettrico di cantiere	1/1	31/05/2023	31/05/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
